

2025 年 7 月紧急救灾项目月报

一. 项目整体进展

（一）项目总体情况

2025 年 7 月，壹基金紧急救灾计划常规救灾行动共开展【22】次救灾行动，惠及 10 个省（直辖市）13 个市（州）22 个县（市、区），共计【66】家社会组织和【2241】人次志愿者参与，约【219778】人次受益。

7 月，在腾讯公益慈善基金会的支持下，壹基金联合救灾项目合作伙伴有序推进多项公益项目：在广东省怀集县中洲镇，针对洪灾影响下的特殊困难群体，发起灾后“怀集灾后家庭暖心券”行动，为当地 636 户低保户、特困家庭发放灾后家庭暖心券；在贵州省榕江县，通过数字关爱平台，创新采用线上“关爱卡”的形式，向榕江县富民社区受灾居民发放“榕江救灾温暖箱”；同时推进数字以工代赈项目，支持榕江县 2 个社区的受灾群众参与村庄淤泥清理、垃圾清运、居委会环境清扫及消杀活动，共计【280】位受灾群众参与。

7 月，西藏定日 6.8 级地震灾后重建相关工作有序推进：安全家园项目完成资助协议签署，确立与社会组织及属地执行伙伴的合作关系，配套物资选型、采购工作已完成并已陆续发货，各项目点捐赠方匹配与确认工作同步完成。灾后乡村幼儿园及校园社区运动场援建项目推进有序，项目资助协议均已签署，部分项目已开始动工。支付宝公益平台支持的【班级梦想拼图计划】在西藏定日县第二中学持续开展中。

7 月，广东梅州洪涝灾害灾后重建项目，梅州市平远县差干镇黎坊桥援建项目进展顺利，目前已经完成三条桩浇筑工作，第四条桩准备开始浇筑。


（二）主要项目活动进展

1. 紧急救灾项目

2025 年 7 月，我国多地遭遇极端天气和自然灾害，以暴雨、山洪、地质灾害为主，华北、华东地区受灾严重，多地启动应急响应，开展救援和转移安置工作。壹基金 7 月分别在 10 省（直辖


市)启动22次救灾响应,共66家社会组织和2241人次志愿者参与,向22个县(市、区)受灾影响的儿童或家庭发放可口可乐饮用水451236瓶、救灾温暖箱2268个、夏季温暖包3066个、粮油包24217套、家庭消杀箱5000个、过渡安置箱7855个、夏凉被5000床、挖掘机15台、铲车15台等生活物资及设备,并支持救援队、社会组织对受灾区域开展清淤及消杀行动,约219778人次受益。



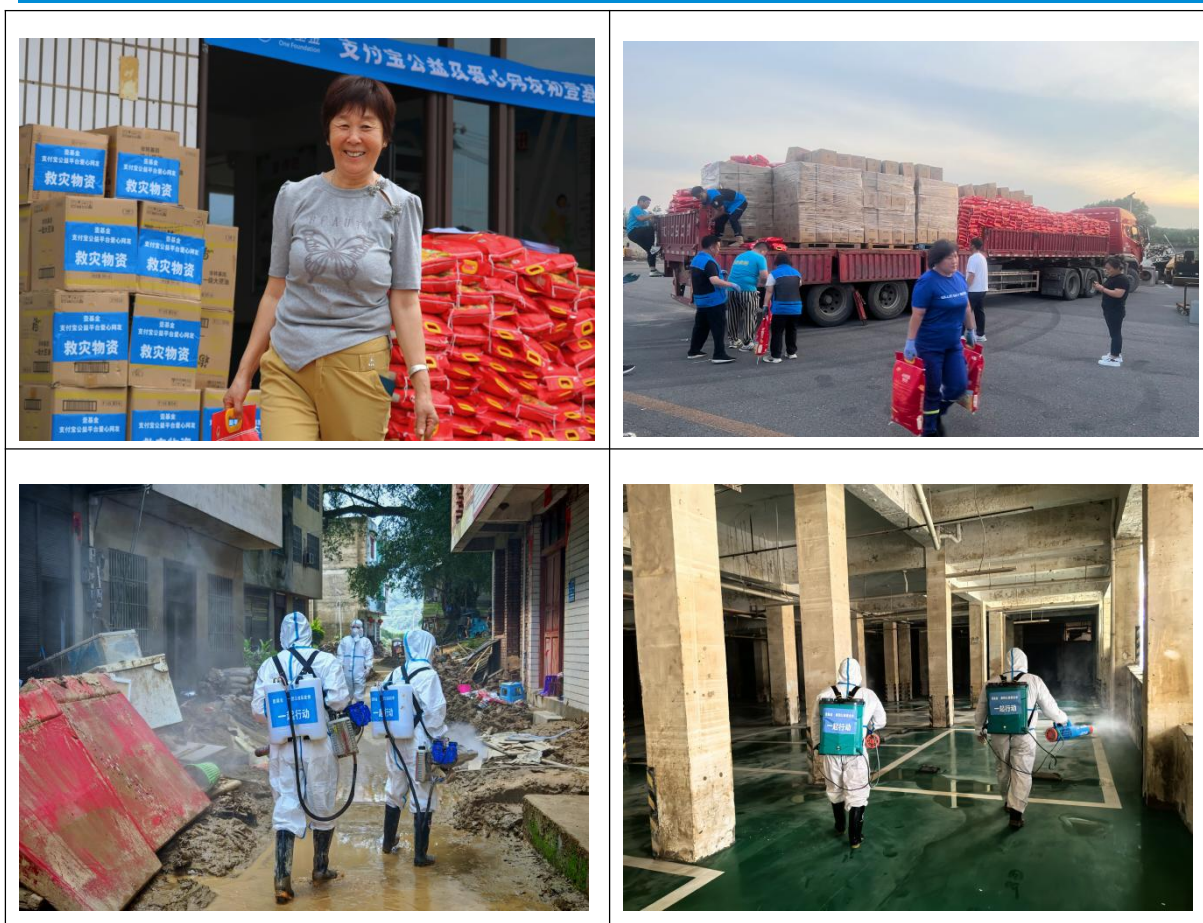

2. 广东省“怀集灾后家庭暖心券”项目


在腾讯公益慈善基金会的支持下，2025 年 7 月，在怀集县中洲镇政府的指导支持下，腾讯公益慈善基金会联合壹基金发起灾后“怀集灾后家庭暖心券”行动，为中洲镇受洪灾影响的 636 户低保户和特困家庭发放灾后家庭暖心券，支持受灾群众购买因洪涝灾害损失的家庭生活用品及小电器，截止 7 月底已有 466 户领取。

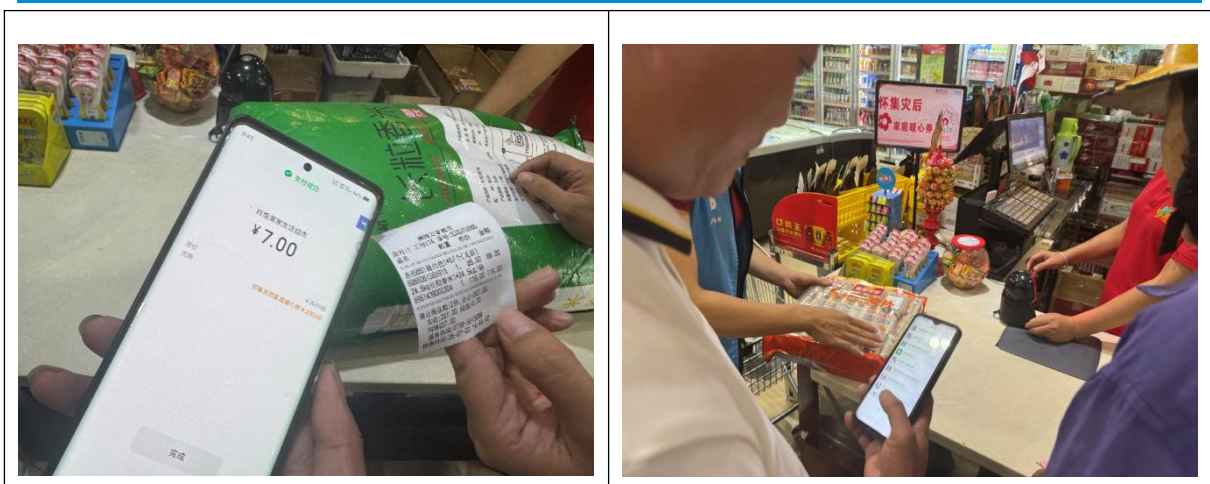

3. 贵州省榕江县数字关爱卡及数字以工代赈活动

在腾讯公益慈善基金会的支持下，2025 年 7 月，腾讯公益慈善基金会联合壹基金在贵州省榕江县，通过数字关爱平台，采用线上“关爱卡”的创新形式，精准且高效地向榕江县富民社区受灾居民发放“榕江救灾温暖箱”。同时在贵州省榕江县场坝社区、丰乐社区开展数字化以工代赈活动，组织 280 位受灾群众参与社区淤泥清理、垃圾清运、居委会环境清扫及消杀作业，助力灾后社区恢复。



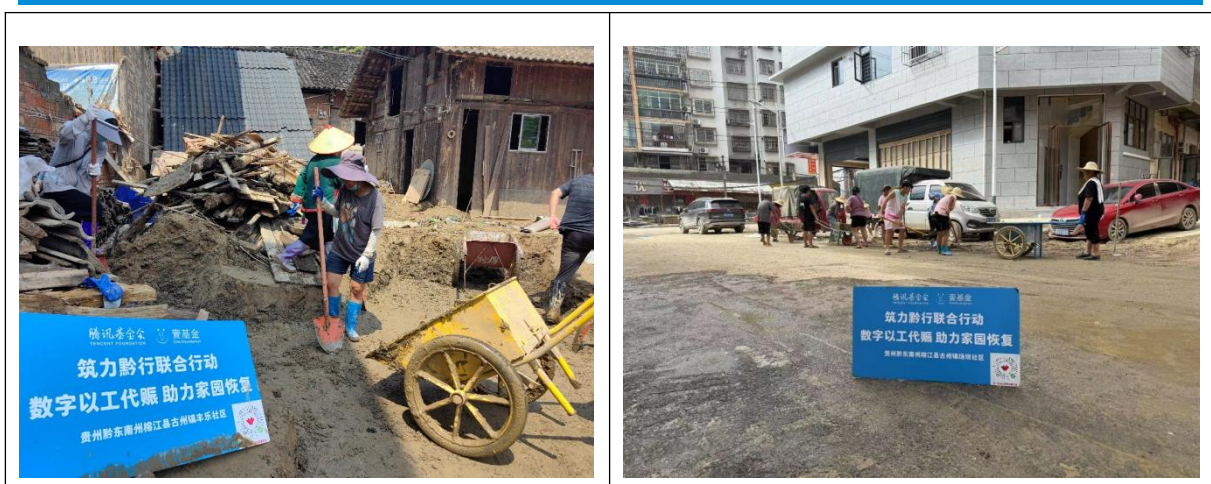

4. 西藏定日 6.8 级地震灾后重建项目

（1）安全家园

2025 年 7 月，壹基金灾后安全家园项目在西藏日喀则市定日县顺利完成项目资助协议签署，与灾后安全家园项目管理合作的社会组织及属地执行伙伴正式确立合作关系；该项目配套物资的选型、采购工作已全部完成，自 7 月底起开始陆续发货；与此同时，壹基金紧急救灾项目组完成了各项目点捐赠方的匹配与确认工作，为项目后续推进奠定坚实基础。



(2) 灾后乡村幼儿园与校园社区运动场援建项目

① 乡村幼儿园援建

由深圳龙华区慈善会专项支持的定日县尼辖乡辖龙村村级幼儿园建设项目，于7月22日在定日县尼辖乡辖龙村开始基础放线作业；23日至26日期间完成基础开挖与场地平整工作；27日进入基槽验收等待阶段；29日顺利完成垫层支模及混凝土浇筑施工；30日开展承台及柱筋绑扎作业，项目按计划稳步有序推进。

由字节跳动公益平台及爱心用户联合爱心企业与个人支持的定日县西村乡村幼儿园项目，于7月7日在定日县教育局完成联审、联批、联验全流程审核，并通过公开摇号及中选结果公示后，确定施工单位并签订施工合同。

由支付宝公益平台及爱心网友支持的定日县奶娃村幼儿园项目，于7月7日在定日县教育局完成联审、联批、联验程序，经公开摇号确定施工单位并公示结果；当前处于定日县教育局与施工单位的合同签订阶段，各项前期筹备工作有序推进。

由腾讯公益平台及爱心网友支持的拉孜县曲玛乡措娃村幼儿园项目，于7月15日在拉孜县教育局完成资助协议的正式签署。

②校园运动场援建

定日县曲当乡小学运动场建设项目于2025年7月17日正式进场动工，项目计划于2025年10月17日前完工；截至目前，该项目完成基槽地质验收与基础钢筋工程验收，当前正进行基础混凝土浇筑作业。



③社区运动援建

由爱奇迹支持的定日县扎果社区运动场项目，因前期建设用地涉及林草地，后期场地做了变更；7月份在定日县扎果社区确定新场地位置后，于7月22日正式进场开展放线施工平地工作。



(3) 班级梦想拼图计划

7月，由支付宝公益平台及爱心网友支持的【班级梦想拼图计划】在西藏定日县第二中学持续开展中，由30个班级的班主任带领学生采购班级物资，开展班级文化建设活动。

5. 广东梅州洪涝灾后重建项目

(1) 桥梁援建项目

平远县差干镇桥梁援建项目推进顺利，截至7月31日，差干镇桥梁项目已经完成三条桩基的浇筑工作，第四条桩基已完成前期准备，即将开始浇筑作业。

